

Coordinación de Planeación

*"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"*

**San Cristóbal de Las Casas, Chiapas;**

**05 de julio de 2024**

**Oficio No. UNICH/CP/43/2024**

**Asunto: Informe final 2023.**

**Dr. Eduardo Gerardo Rosas González**  
Director de Fortalecimiento Institucional  
de la DGESUI  
Ciudad de México, Méx.

Con mi afectuoso saludo, me permito dirigirme a usted, para enviar el informe final, de los proyectos aprobados en el marco del Programa Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Ejercicio Fiscal 2023.

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2023		
Prioridad	Proyecto	Periodo
1	Primera etapa de construcción de edificio de 01 nivel para 05 aulas didácticas y obra exterior en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Yajalon.	Final
2	Primera etapa de construcción de edificio de 02 niveles para 08 aulas didácticas y obra exterior en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Oxchuc.	

Anexo al presente, archivo electrónico con información en PDF y Excel, así como copia de Actas de Entrega.

Coordinación de Planeación

*"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"*

**San Cristóbal de Las Casas, Chiapas;**



**05 de julio de 2024**

**Oficio No. UNICH/CP/43/2024**

**Asunto: Informe final 2023.**

Sin más por el momento, agradeciendo la atención al presente, le expreso mis consideraciones.

**ATENTAMENTE**



**Lic. Carolina Antonia Hernández Alfonzo**  
Encargada del Despacho de la Coordinación de Planeación

- C.c.p. Dr. Luciano Concheiro Borquez.- Subsecretario de Educación Superior de la SEP.- Para su superior conocimiento.
  - C.c.p. Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta.- Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural.- Para su conocimiento.
  - C.c.p. Lic. Juan Gregorio Regino.- Director de Educación Intercultural.- Para su conocimiento.
  - C.c.p. Dr. Dionicio Toledo Hernández.- Rector de la UNICH.- Para su conocimiento.
- Archivo.

Sección: 03C

Serie: 03C.05

Subserie: 03.05.02



2023



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTENDENCIA JURISDICCIONAL
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SUPORTE ESTRUCTURAL

Trimestre y año de reporte
Segundo Trimestre
2024

Fecha de elaboración: 04/07/2024

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA



Institución: Universidad Intercultural de Chiapas

Entidad Federativa: Chiapas

Ciclo: 2023-2024

Proyecto:

RSMP/2023/03

Nombre Ing David Hernández Zurita

Cargo: Responsable de Infraestructura

Teléfono: 961 141510 Ext 110

Correo electrónico: david.hernandez@uicchiapas.edu.mx

Doc: 2 (Revisión):

Nombre: Lic. Carolina Arriaga Hernández Albián
Cargo: Encargada del Departamento de Planeación
Teléfono: 961 141 1410 Ext 110
Correo electrónico: carolinar@uicchiapas.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Table with columns for project details, budget, execution calendar, and completion status. Includes rows for 'Primera etapa de construcción de edificio de 22 niveles para 28 aulas...' and 'Primera etapa de construcción de edificio de 12 niveles para 28 aulas...'

Handwritten signature and stamp of the project manager.

Handwritten signature and stamp of the planning coordinator.

Handwritten signature and stamp of the director.

1. Se reportará los cupos que correspondan a la obra o proyecto. Se podrán anular los cupos que no sean necesarios.
2. En caso de cancelar o suspender la obra o proyecto, se deberá informar a la instancia correspondiente.
3. El responsable de los trabajos de infraestructura deberá mantener actualizada la información de los trabajos en el sistema de gestión de recursos humanos.

2023

BIENEFICENCIA FISCAL EN EL QUINTO EJERCICIO DEL REGIMEN

FAM FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Término y año que se reporta:  
Segundo Trimestre 2024

Fecha de elaboración: 05/07/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Universidad Intercultural de CHIAPAS  
Por un Chiapas equitativo y plural

Porcentaje de avance

**100%**

1 Nombre de la obra: Primera etapa de construcción de edificio de 01 aula para 05 aulas didácticas y obra exterior en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Yajalon.

**GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO**

**CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO**

Simbología

- A construir
- Construido

**UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS**


Simbología

- F1: Fachada principal
- F2: Fachada Posterior
- F3: Lateral Derecho
- F4: Lateral izquierdo

Postal: Carr. A la ventana - Km. 1.3 - Yajalon, Chiapas C.P. 29930.

Dirección

FOTOS

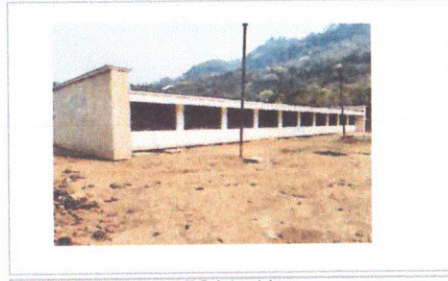

**Observaciones:**

Mediante Oficio No. INPECH/DFY/IDE/S/0315/2024, al Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, informo lo siguiente:

En la construcción del módulo de 05 aulas didácticas en este periodo se concluyó al 100%.

Se envían Actas de Entrega Recepción y Actas Administrativas de Entrega Recepción.



ING. DAVID HERNÁNDEZ ZORRILLA  
OBRAS

ING. CAROLINA ANTONIA HERNÁNDEZ ALFARO  
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN

DR. GERARDO FOLSECO HERNÁNDEZ  
RECTOR

**NOTA:**  
\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una planifolia, se podrán copiar tantas planifolias como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



2023

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE SE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Título y año que se reporta:  
Segundo Trimestre 2024

Fecha de elaboración: 05/07/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Nombre de la obra: Primera etapa de construcción de edificio de 02 aulas didácticas y obra exterior en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Oxchuc.

**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS**  
Por un Chiapas equitativo y plural

Porcentaje de avance

**100%**

**GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO**

**CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO**

Simbología

- A construir
- Construido

**UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS**

Simbología

- F1: Fachada principal
- F2: Fachada Posterior
- F3: Lateral Derecho
- F4: Lateral Izquierdo

Dirección  
Postal: Camino a Piedra Escriba K.M. 1.5, Col. Camino a Piedra Escriba Mpio. de Oxchuc, Chiapas C.P. 29960.

FOTOS

F1: Fachada principal

F2: Fachada principal

F3: Lateral derecho

F4: Gradas

Interior

Observaciones:

Mediante Oficio No. INFRECH/DFY-PROES/0315/2024, el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, informo lo siguiente:

En la construcción del módulo de 02 aulas para 08 aulas didácticas, en este periodo se concluyó el 100%.

Se envían Actas de Entrega Recepción y Actas Administrativas de Entrega Recepción.

DR. DAVID HERNÁNDEZ ZORRERA  
DIRAS

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN

DR. JESÚS TOLIBO HERNÁNDEZ  
RECTOR

NOTA:  
\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se podrán copiar tantas plantillas como sean necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
